



SUPERAMENTO DELL'ABITATO DI CHIESINA UZZANESE

1° LOTTO

Variante per l'eliminazione del traffico pesante da P.zza Mazzini

PROGETTO ESECUTIVO

PROG.
04S002A0

23DG

Cronoprogramma dei lavori

nome file:23DG_Cronoprogramma dei lavori.pdf

PROGETTISTI:

Ing. Alessandro SILVIETTI

Geom. Paolo ANDREINI

GEOLOGO:

Geol. Andrea BARTOLINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:


Ing. Paolo MAZZONI

COLLABORATORI:

Geom. Giacomo BALLERI

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 0 | Dicembre 2005 | Emissione |
|---|---------------|-----------|

| | | |
|------------------|-------------|----------------|
| <i>Revisione</i> | <i>Data</i> | <i>Oggetto</i> |
|------------------|-------------|----------------|

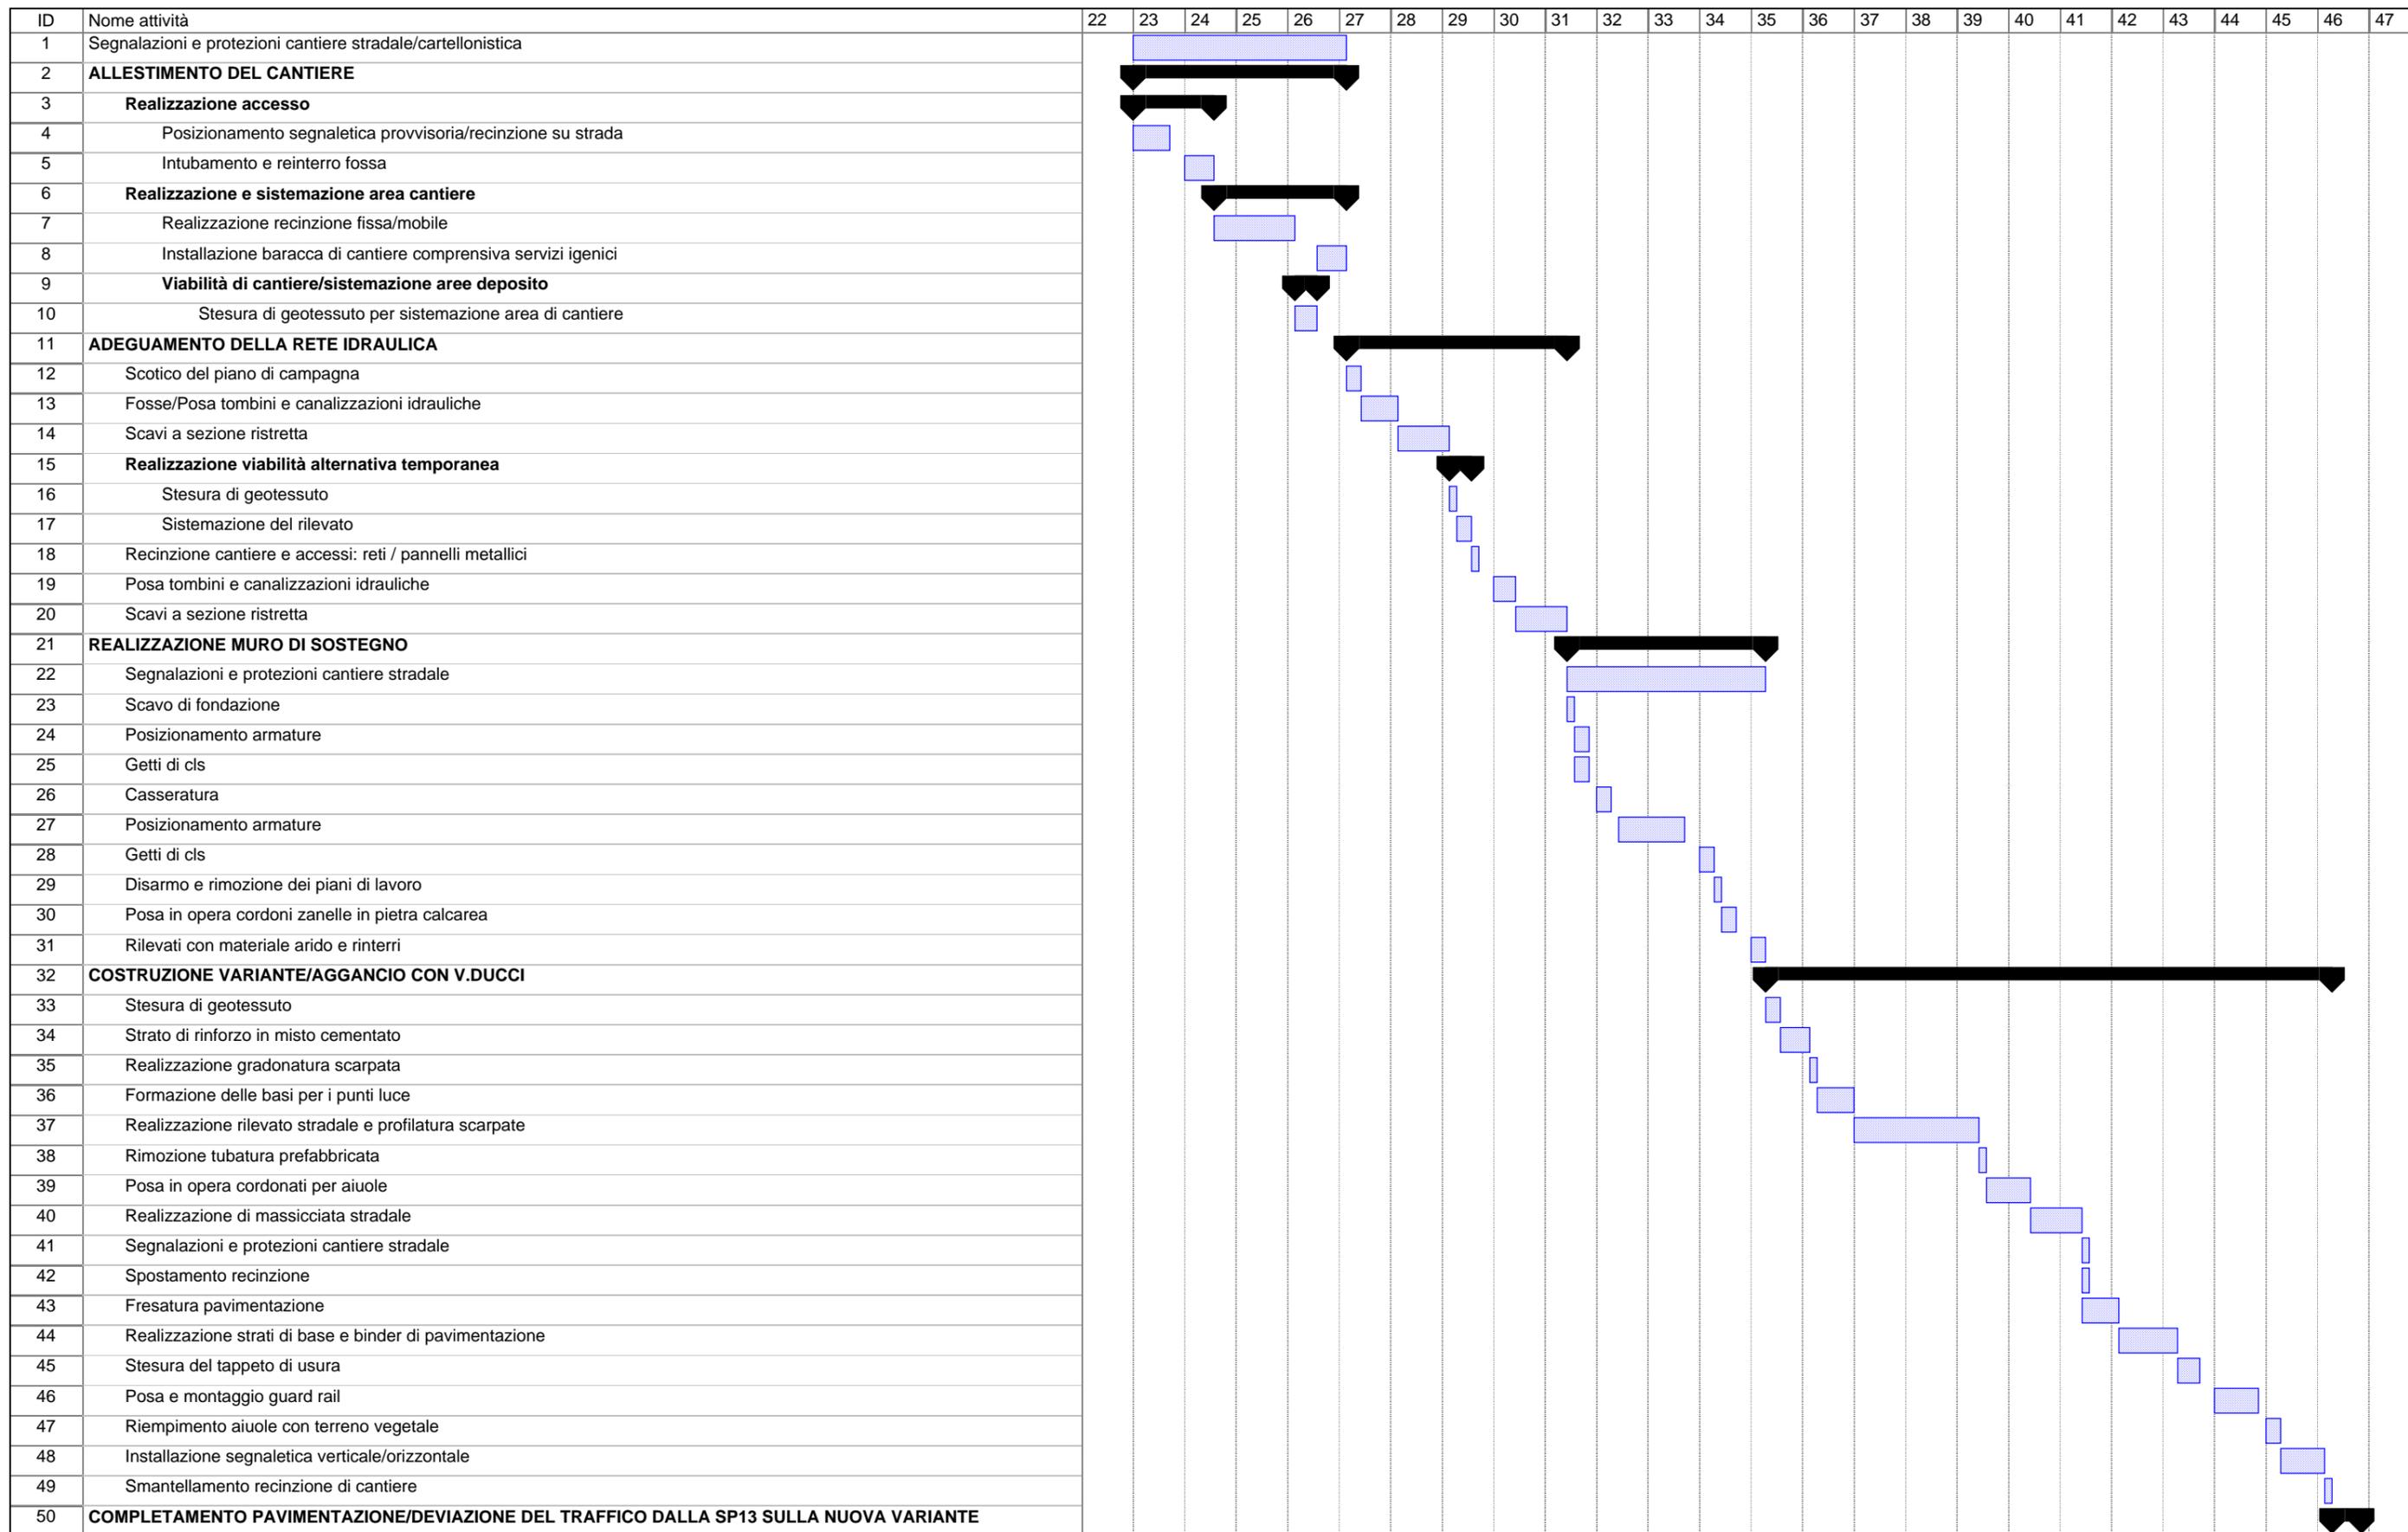

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------|--|--------------------|--|------------------|--|----------|--|
| Progetto: 1° Lotto - Variante Chiesina | Attività | | Avanzamento | | Riepilogo | | Attività esterne | | Scadenza | |
| Data: Dicembre 2005 | Divisione | | Cardine | | Riepilogo progetto | | Cardine esterno | | | |

| ID | Nome attività | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 51 | Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Realizzazione strati di base e binder di pavimentazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Stesura del tappeto di usura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Completamento segnaletica verticale/orizzontale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Smantellamento viabilità alternativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Smantellamento recinzione e area di cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | OPERE DI COMPLETAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Preparazione scarpate con biostuoia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Idrosemina scarpate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------|--|--------------------|--|------------------|--|----------|--|
| Progetto: 1° Lotto - Variante Chiesina | Attività | | Avanzamento | | Riepilogo | | Attività esterne | | Scadenza | |
| Data: Dicembre 2005 | Divisione | | Cardine | | Riepilogo progetto | | Cardine esterno | | | |
